

15

COMUNE DI MILAZZO

(Prov. Messina)

PROGETTO PER IL RESTAURO E L'ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA VIGENTE DELLA CHIESA DI S.GIUSEPPE
SITA NEL COMUNE DI MILAZZO

ELABORATI

CRONOPROGRAMMA



CITTA' DI MILAZZO
4° SETTORE - Lavori Pubblici e Patrimonio
PARERE IN LINEA TECNICA FAVOREVOLE

Reso con provvedimento n. 82 del 15.05.2017
dell'importo di Euro 661.090,61
Milazzo, 15.05.2017

Il R.U.P.
Arch. Carmelo Draga

CITTA' DI MILAZZO
4° SETTORE - Lavori Pubblici e Patrimonio
(Validazione ai sensi dell'art.26 D.Lgs n. 50/2016)
Il progetto dell'importo complessivo di Euro 661.090,61
ha formato oggetto di validazione con verbale
del 15.05.2017 cui fa riferimento.
Milazzo, 15.05.2017

Il R.U.P.
Arch. Carmelo Draga

DITTA:

P. Stefano Seabe

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
ARCH. MELANIA MUSCIANISI
IL PROGETTISTA
ARCH. MELANIA MUSCIANISI

Agg. 05/05/2017


DATA

30/06/2015

STUDIO DI ARCHITETTURA E RESTAURO ARCHITETTONICO: Arch. Melania Muscianisi
Piazza Roma, 40 - 98057 Milazzo (Me) - Tel./Fax. 090 9223799

DURATA (gg)

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	14/02/2016	14/02/2016	0
2	B	Preparazione cantiere	14/02/2016	20/02/2016	6
3	C.1	LAVORI ESTERNO Demolizione intonaco	21/02/2016	29/02/2016	8
4	C.2	Revisione copertura	28/02/2016	20/03/2016	21
5	C.3	Pulitura e sarciture	21/03/2016	02/04/2016	12
6	C.4	Posa nuova guaina e rifacimento piano terrazza	13/03/2016	21/03/2016	8
7	C.5	Rifacimento intonaco e consolidamento muratura	02/04/2016	17/05/2016	45
8	C.6	Rimozione depositi coerenti su superfici in pietra	15/05/2016	23/05/2016	8
9	C.7	Scavo per realizzazione vespaio	24/05/2016	11/06/2016	18
10	C.8	Realizzazione vespaio	04/06/2016	14/06/2016	10
11	C.9	Ripristino pavimentazione	11/06/2016	18/06/2016	7
12	D.1	LAVORI INTERNI Demolizione intonaco interno ammalorato	16/06/2016	28/06/2016	12
13	D.2	Demolizione pavimentazione e soglie	29/06/2016	09/07/2016	10
14	D.3	Interventi impiantistici	10/07/2016	31/07/2016	21
15	D.4	Collocazione pavimenti e opere di finitura	22/07/2016	08/09/2016	48
16	D.5	Intonacatura	10/08/2016	31/08/2016	21
17	D.6	Coloriture di pareti e soffitti	23/08/2016	29/09/2016	37
18	D.7	Revisione serramenti	30/09/2016	18/10/2016	18
19	D.8	Opere di Protezione	19/10/2016	12/11/2016	24
20	E	Pulizie e smobilizzo	13/11/2016	18/11/2016	5
21	F	Fine lavori	19/11/2016	20/11/2016	1

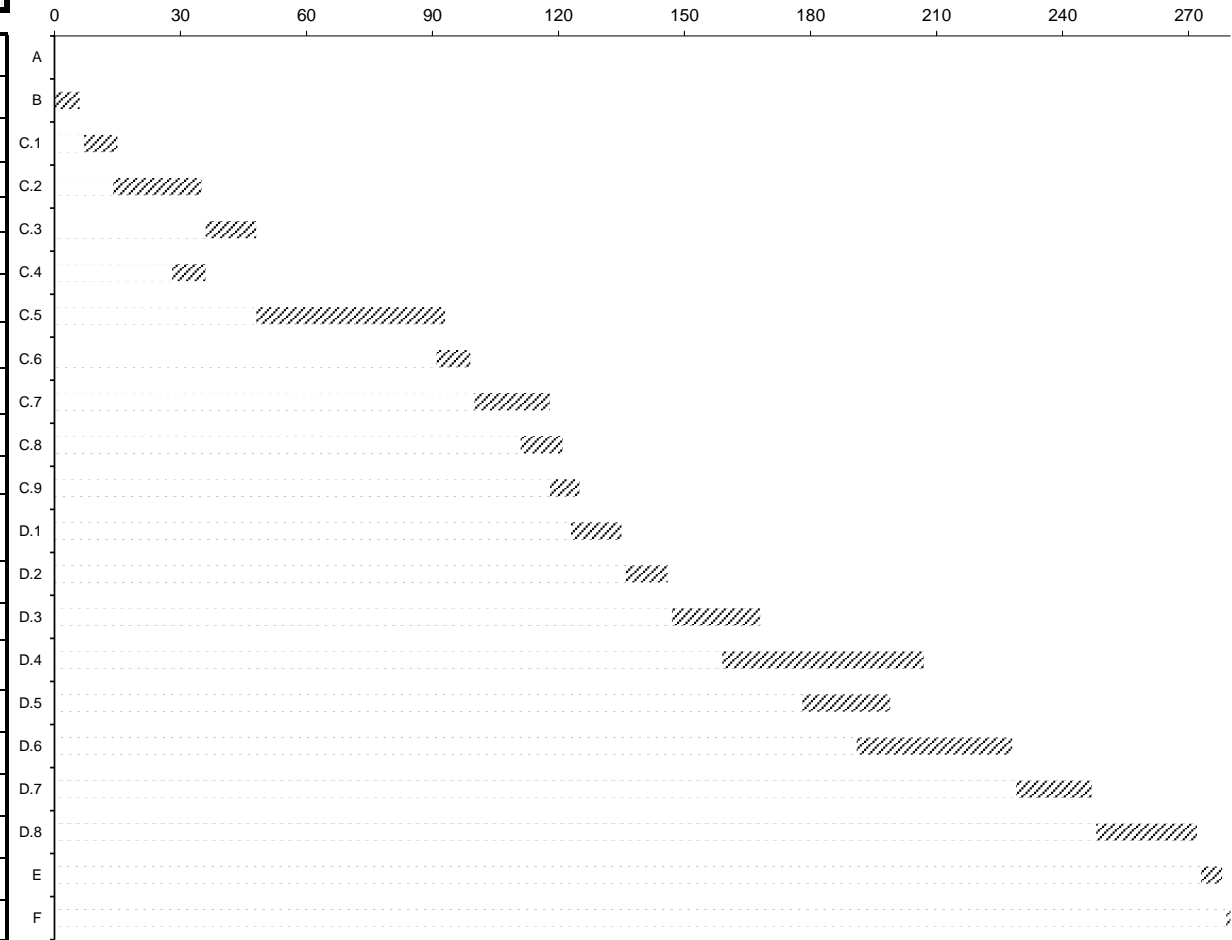

Inizio dei lavori
0 gg

Fine lavori
280 gg

TC

280

gg.

naturali consecutivi
